

令和7年度 門川町次期衛生センター(仮称)建設工事の工事進捗


【第1四半期 令和7年4月 ～ 令和7年6月 分】

●令和7年4月



4 月中に 9 9 か所分の基礎杭の打設が完了しました

●令和7年5月

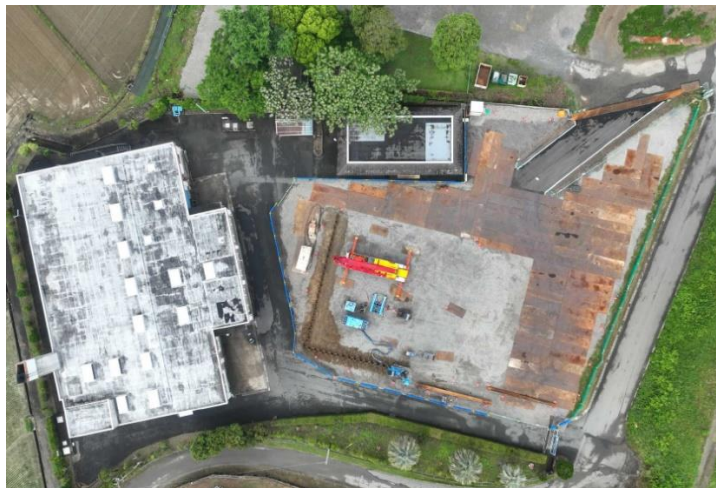

地下躯体工事を行うために、山留工事を行っています

●令和7年6月



山留工事も終わり、地下階の掘削工事を行っております



地下部分にはし尿や汚泥を処理するための水槽設備などが配置される計画となっています
