

令和7年度 門川町次期衛生センター(仮称)建設工事の工事進捗

【第2四半期 令和7年7月 ～ 令和7年9月 分】

●令和7年7月




地下階の掘削工事が終わりました



地下底盤部分の配筋及びコンクリートの打設を行いました

●令和7年8月

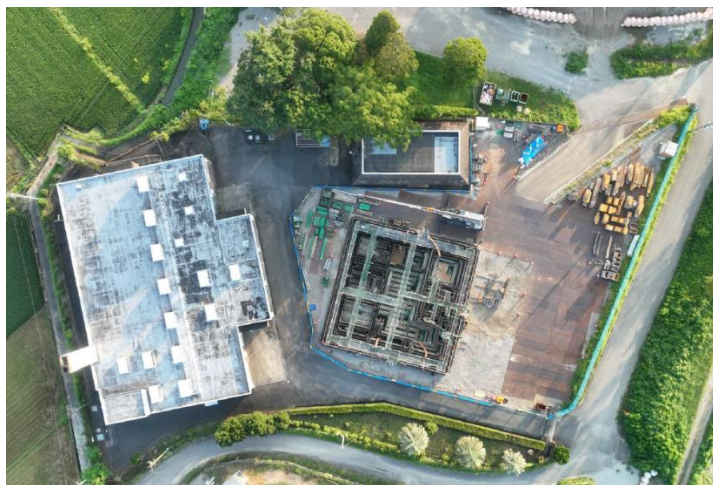

地下躯体の外壁及び水槽、柱部分までコンクリート打設が完了しました



これまでに打設したコンクリートの量は約 712 m³になります



次工程で使用する 1 階の梁・スラブ型枠を組み立てています

●令和7年9月



処理棟側1階の梁・スラブまでコンクリート打設が完了しました



円形の穴部分が水槽の開口部になり、し尿処理の各工程で使用する水槽が地下に設置されています
