

令和7年度 門川町次期衛生センター(仮称)建設工事の工事進捗

【第4四半期 令和8年1月 ～ 令和8年3月 分】

●令和8年1月





地上部分の工事を行うために仮設足場を設置し、1階部分の型枠工事を行っています



地上部分の工事と並行して、地下階に、し尿処理施設に必要となる機器等の搬入、設置を行う「据付工事」も行っています

●令和8年2月

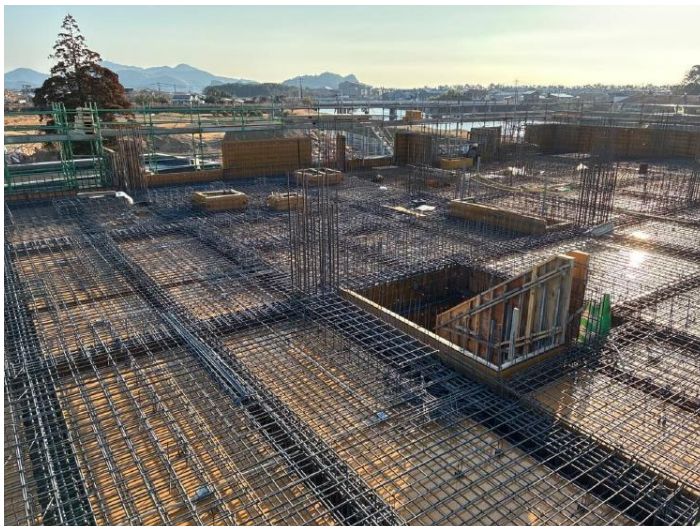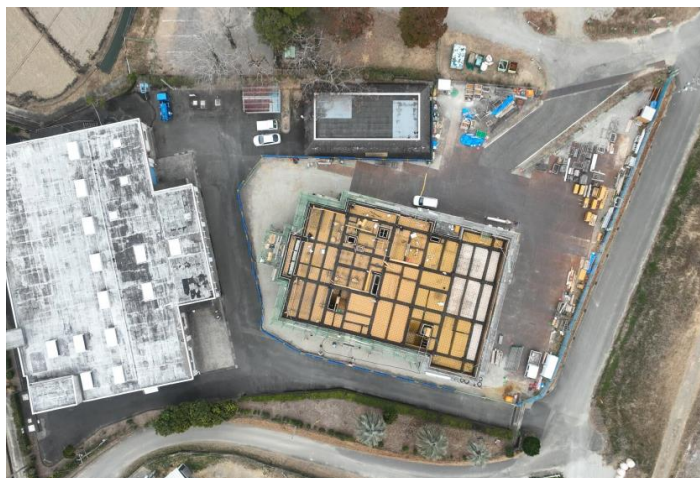

1階（壁・天井）部分の型枠が組み上がりました




し尿処理に必要な機器を地下階に搬入し、設置を行っています

●令和8年3月



コンクリート打設後、コンクリートが基準強度を満たしたため、型枠の一部を解体しています

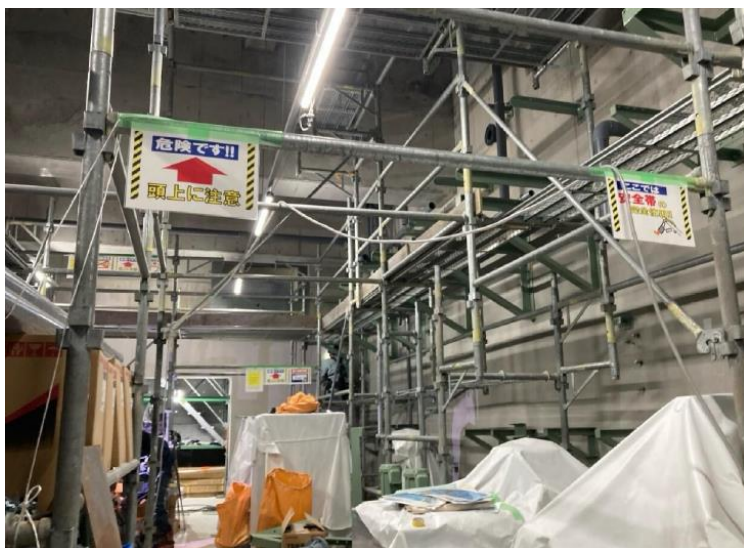

地下階に仮設足場を設置し、配管等の敷設を行っています
